睡眠经济市场调研与产品孵化
项目时间计划书

十四天并行计划

项目周期

2026 年 11 月 2 日 — 2026 年 11 月 15 日

Day 1 – Day 14

目录

01 项目基本信息 3

02 项目背景与定位 3

03 项目总体目标 3

04 项目进度与时间安排 4

05 阶段性里程碑 12

06 团队分工与责任安排 12

07 最终交付成果与验收标准 12

项目周期：2026年11月2日至2026年11月15日（Day1–Day14）

01　项目基本信息

项目	内容
项目名称	睡眠经济市场调研与产品孵化项目
项目周期	2026年11月2日至2026年11月15日（共14天，Day1–Day14）
方向名称	原创睡眠搭子与沉浸式安抚
服务对象	白领差旅人群（居家日常陪伴为次要延伸，不进主验收）
核心场景	异地客房过夜（抵达当晚、连续出差中段、散场归寝等）
地理口径	中国为主，全球对照
终态三项成果	（A）睡眠经济市场调研报告；（B）商业计划书（BP）；（C）demo（以网页呈现，AR 后置可选）

本项目面向差旅白领，在客房过夜场景提供由原创 IP、场景与声音构成的单向低唤醒沉浸陪伴，帮助用户暂时从工作思绪中抽离，并形成可演示、可商业讨论的内容体验切口。机制上采用差旅沉浸、单向低唤醒路径，不以开放催睡长聊或多轮情绪深聊作主路径；不作疗效或医疗宣称，体验验收侧重完播与关停、主路径可走通与场景可用性，不验收睡眠时长或睡眠评分改善。人工智能及相关能力仅作为调研整理、设计辅助与实现提效的工具与手段，不是本项目选题，亦不作为对外产品主词。市场叙述以中国为主、全球对照；广义睡眠经济大盘数字仅作产业背景，不作本软件或内容切口的可触达市场（TAM）测算。

02　项目背景与定位

本项目围绕睡眠经济中「入睡前与过夜」场景的真实困扰、现有应对方式与可验证的产品与服务切口，完成调研、方案设计与演示。已定方向为**原创睡眠搭子与沉浸式安抚**：差旅白领在异地客房过夜时，常见「工作思绪难抽离、环境陌生、缺少熟悉安抚仪式」一类困扰；现有应对多为刷短视频、白噪音应用、酒店电视或不处理。本项目不以开放催睡聊天或疗效承诺作答，而以原创小 IP、场景与声音构成沉浸环境，走「进入 → 被场景与角色吸引 → 短陪伴或有限选项 → 自然收束并退出」的单向低唤醒路径，完成注意力转移与可演示体验闭环。

产业背书可衔接已开展的睡眠经济市场调研材料：大盘口径可作文旅、家居、科技等背景陈述，不得外推为本切口软件 TAM。本周期将按搜集—核验—撰稿—审核全链路重新完成调研报告，不以既有编辑稿替代。商业讨论优先内容包、联名或主题房加价、酒店或差旅捆售等路径；单独 ToC 月订阅不作唯一商业假设。技术载体以网页呈现的 demo 优先保证主路径可演示；可选 WebAR 或落角色开场仅作仪式入口且后置，弱网与拒相机须有屏内角色兜底。

03　项目总体目标

本周期设定三项相互衔接的总体目标，分别对应终态三项成果。

（一）目标 A：完成围绕既定方向的睡眠经济市场调研报告

在产业背书可溯源材料基础上，按「原创睡眠搭子与沉浸式安抚」方向完成市场与竞品分析、用户需求与痛点摘要、平台侧观察及选题论证，形成可独立审阅的睡眠经济市场调研报告。报告须写清目标用户、核心问题、主路径机制、付费假设讨论框架，以及相关边界处理；公开数字凡未经二次核对须标注待核实；禁止将广义睡眠经济大盘误用为软件 TAM。

（二）目标 B：完成与调研同口径的商业计划书（BP）

在调研阶段性结论可支撑的前提下，形成商业计划书：固化产品定位与价值主张、使用方与付费方假设、收入路径优先级（内容包、联名或主题房加价、酒店或差旅捆售等）、资源与节奏要点，以及合规与表述边界。商业计划书与调研报告对外口径一致，不以疗效指标或虚构合同作为商业成立条件。

（三）目标 C：完成可演示主路径的 demo（以网页呈现，AR 后置）

制作可交互或可演示的网页原型，展示「选择角色与场景 → 进入环境 → 观看或安静相伴或有限短互动 → 自然结束并退出」闭环，使评审与体验者在无长讲解情况下走通主路径。默认低互动、可关停、单次体验硬收束；禁止开放催睡长聊作主路径。WebAR 等沉浸开场仅作后置可选项，不阻塞主 demo 验收，亦不构成疗效卖点。

（四）三项目标的逻辑关系

三者构成「论证 → 商业化表述 → 可体验验证」的闭环，而非彼此替代：

关系	说明
A 支撑 B	睡眠经济市场调研报告提供用户、竞品、场景与付费线索的证据基础；商业计划书的定位与路径假设须可回溯至调研结论
B 约束 C	商业计划书明确的主路径、边界与优先验证点，约束 demo 的功能取舍，避免 demo 偏离既定方向或堆砌疗效向能力
C 回证 A / B	demo 用于检验主路径可理解、可走通、可关停；测试观察反哺报告表述与商业计划书中待验证假设，但不预写「睡得更好」类结论
并行与依赖	调研可先行并分阶段输出结论窗口，供商业计划书启动；demo 可在 Day1 口径与产品方案冻结后与调研并行。终态须 A、B、C **三项齐备**，不以单项交付替代整体验收

04　项目进度与时间安排

本章说明 14 天日计划、三工作流并行关系、硬前置与空档安排。

4.1　三工作流并行原则

1. **调研**为主干证据链：按「搜集 → 分析 → 撰稿 → 核验 → 审核」重新排期；既有调研材料仅可作公开出处索引线索，不得据此压缩搜集—核验—撰稿工期。

2. **商业计划书**自 Day1 起搭建骨架并行；凡依赖调研结论的数字与表述一律标「待调研定稿后更新」，并在 Day9、Day11 两个窗口强制刷新。财务测算 Day3 起可搭骨架，Day7 / Day10 与调研对齐，Day11–12 撰稿与自检；全程不编造已签约金额。
3. **demo**自 Day1 确认以网页呈现的主路径后与调研并行；产品边界（单向低唤醒、禁开放长聊、不作疗效）以 Day1 口径为准。AR / WebAR 后置，不得挤占主路径测试空档。

4.2 硬前置（未满足则下游停）

下游事项	硬前置
demo 主路径故事板与实现	Day1 口径锁定（禁开放催睡长聊；网页优先）
商业计划书财务情景定稿	至少具备调研用户 / 商业边界草稿（Day5+），并经 Day9 报告初稿窗口刷新
睡眠经济市场调研报告「终稿」宣称	Day6 与 Day10 两轮核验空档已执行
Day14 三项终验	Day13 预终验联调 + 终审书面结论（通过或有条件通过且阻塞项已改）

4.3 图表总览

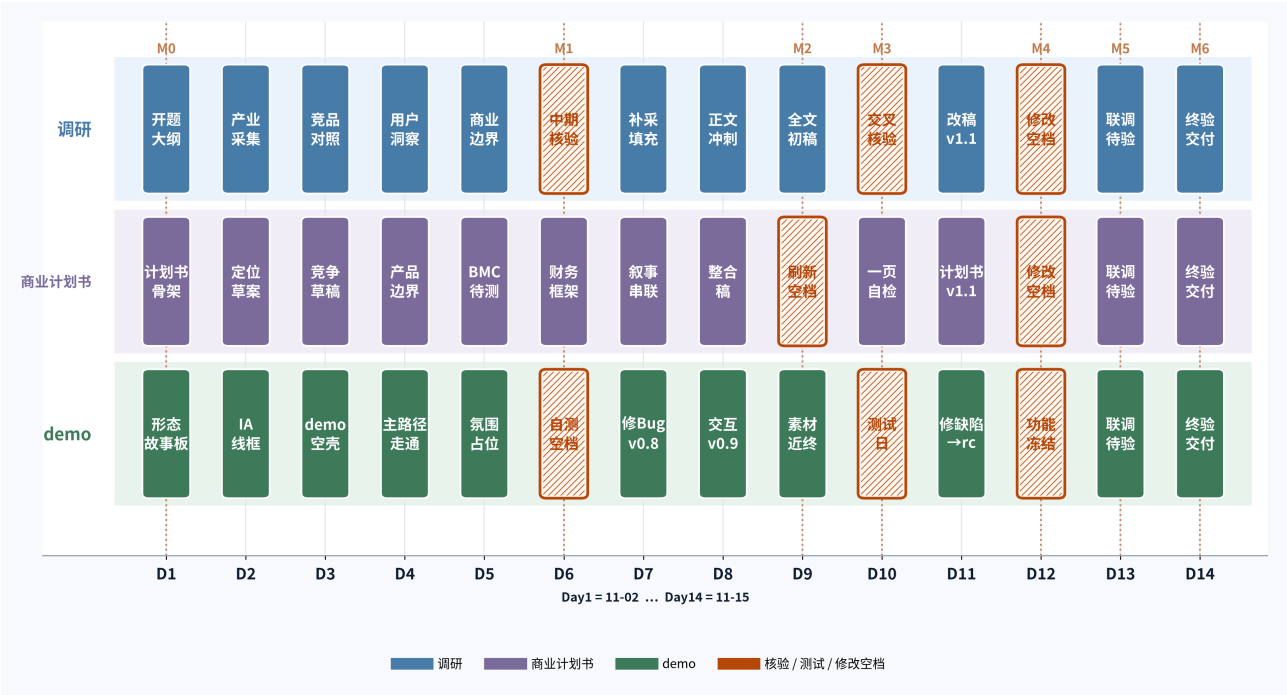


图4-1　14天三工作流甘特（调研 / 商业计划书 / demo）
按日展开三条并行泳道；空心或斜线条为核验、测试或修改空档；虚线标 M0–M6。

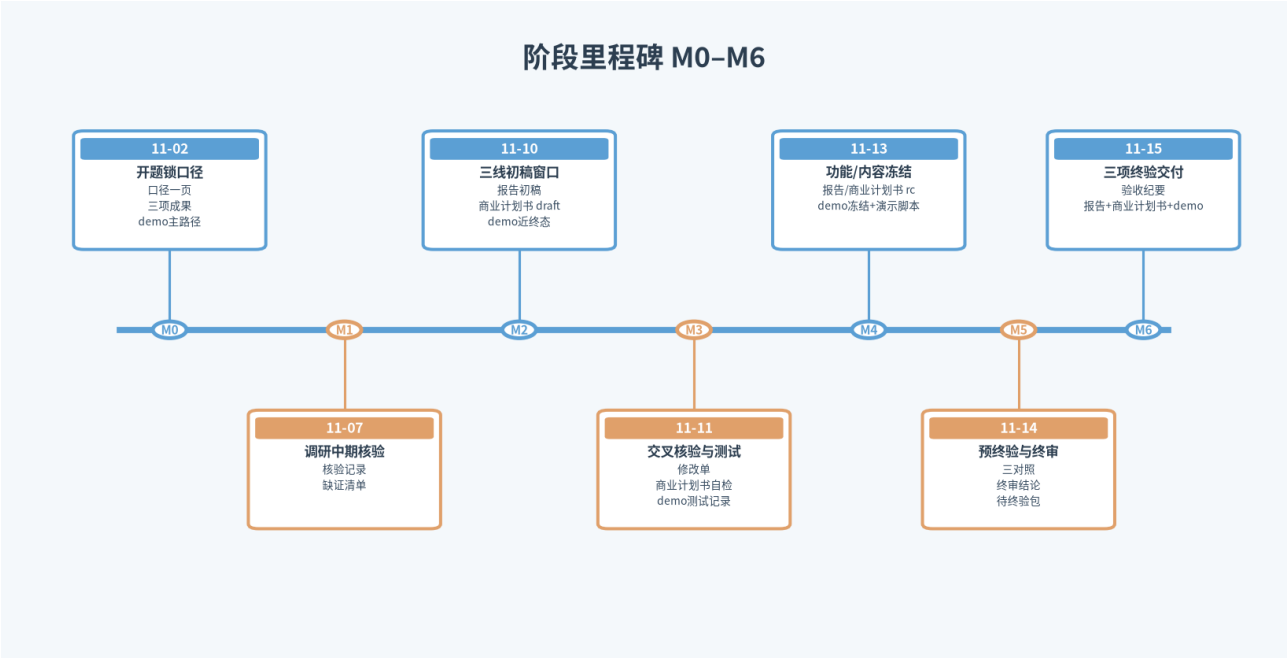


图4-2　阶段里程碑 M0–M6

对齐开题锁口径 → 中期核验 → 初稿窗口 → 交叉核验与测试 → 冻结 → 预终验 → 三项终验交付。

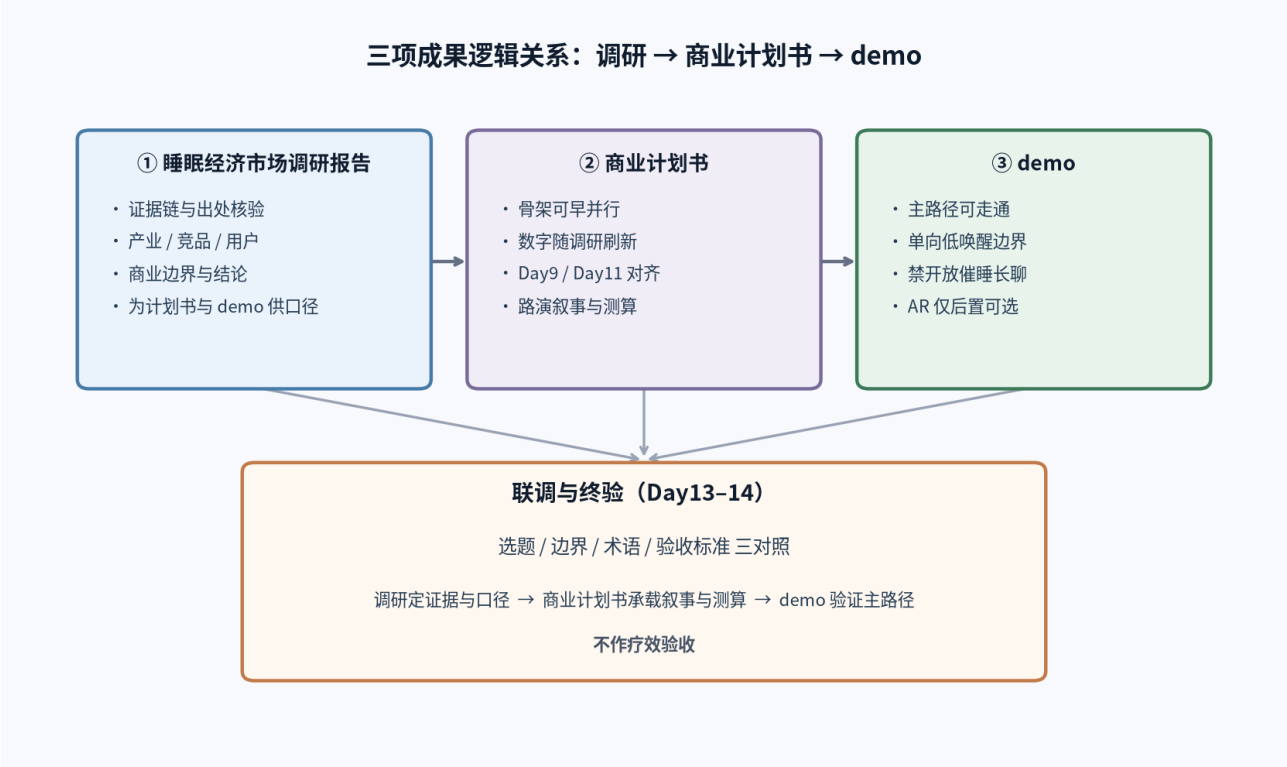


图4-3　三项成果逻辑关系

调研提供证据与口径，商业计划书承载叙事与测算，demo 验证主路径；Day13–14 三对照联调后终验。

4.4　14 天日计划核心表

同一天多行表示三工作流并行。依赖列写明前置条件；未满足不得假装完成。调研按搜集—核验—撰稿—审核全链路重新安排；demo 按网页优先、AR 后置安排。

天数	日期	工作模块	具体任务	预期产出	依赖/前置
Day1	11-02 一	项目统筹	锁口径：方向「原创睡眠搭子与沉浸式安抚」、三项成果、验收偏完播 / 主路径可走通；建资料库与版本目录	口径一页 + 目录骨架	任务书可读；口径可锁
Day1	11-02 一	调研	开题：研究问题清单、资料源白名单、出处模板、章节大纲；抽取待复开出处索引	调研大纲 v0 + 出处模板	Day1 口径确认
Day1	11-02 一	商业计划书	建目录与「待调研更新」占位规则；列出需从调研输入的字段；财务禁区清单	商业计划书骨架 v0（全标待更新）	Day1 口径；不依赖终稿调研
Day1	11-02 一	demo	确认主路径 = 可交互网页；AR 仅后置可选；列出主路径故事板	demo 形态一页 + 故事板 v0	Day1 口径；禁开放长聊
Day2	11-03 二	调研	产业背书采集：睡眠经济定义 / 范围 / 规模与前景（公开可溯源）；数字二次核对清单启动	产业素材包 + 待核实数字表	Day1 大纲

天数	日期	工作模块	具体任务	预期产出	依赖/前置
Day2	11-03 二	商业计划书	定位草案：差旅白领场景、付费方假设（内容包 / 捆售 vs 纯订阅）—标注依赖调研证据	定位草案 v0（待证据）	Day1 商业计划书骨架
Day2	11-03 二	demo	信息架构与页面清单；静态线框（首页 / 场景页 / 短陪伴页 / 退出收束）；可选仅启动仓库 / 目录。**本日不算可点空壳完成**	IA + 线框 v0（或仓库 / 目录启动说明）	Day1 故事板
Day3	11-04 三	调研	竞品 / 对标采集；对照表字段统一；链接可达性抽检	竞品对照表 v0	Day1 大纲
Day3	11-04 三	商业计划书	竞品商业模式摘录 → 「市场与竞争」节草稿；成本结构骨架（CapEx / OpEx 分类）	商业计划书竞争节草稿 v0；成本骨架	竞品表启动即可并行；demo 载体确认
Day3	11-04 三	demo	网页脚手架：路由 / 组件骨架；主路径可点通空壳；素材占位规范。**「可点空壳 demo v0」完成标志仅挂本日本行，不前移至 Day2**	可点空壳 demo v0（完成标志：主路径空壳可点通）	Day2 IA + 线框（或目录已建）；技术边界约束可选
Day4	11-05 四	调研	用户与场景尽调（公开 / 二手 / 可复现方法）；产业链启动	用户洞察笔记 v0 + 证据卡	Day1 研究问题清单
Day4	11-05 四	商业计划书	价值主张与产品边界写入商业计划书；收入逻辑草图（谁付费、付什么、何时付）	商业计划书产品节草稿 v0；收入逻辑表	Day1 口径；洞察可并行
Day4	11-05 四	demo	主路径交互：短陪伴 / 有限选项、自然结束与随时关停；过渡与陪伴主态壳	主路径可走通 v0.5	Day3 空壳
Day5	11-06 五	调研	商业边界与非主选说明；大盘数字 ≠ 差旅切口 TAM；中国 / 全球对照推进	边界专节草稿	Day2–4 素材
Day5	11-06 五	商业计划书	商业模式画布；单位经济试算框架（公式与输入格，可空）	BMC + 待测字段表	Day4 价值主张
Day5	11-06 五	demo	视觉与内容占位：IP / 场景氛围（克制、非疗效文案）；自然收束 + 全局关停；静音主路径端到端点通	氛围页 + 文案占位；静音走通记录	Day4 主路径
Day6	11-07 六	调研	**中期核验空档**：出处抽检、矛盾数字标注、缺证清单；禁止堆新章掩盖缺口	核验记录 + 缺证清单 v1	Day2–5 产出齐备
Day6	11-07 六	商业计划书	财务测算框架：保守 / 基准 / 乐观情景；全部标假设来源	测算表 v0	Day5 BMC
Day6	11-07 六	demo	**可用性自测空档**：主路径走通录像 / 截图；有限短互动与弱网兜底 UI；问题清单	自测报告 v0 + Bug 表	Day5 氛围页

天数	日期	工作模块	具体任务	预期产出	依赖/前置
Day7	11-08 日	调研	按缺证清单补采；三块合成初稿目录填充	报告初稿目录填充≥60%	Day6 缺证清单
Day7	11-08 日	商业计划书	叙事串联：问题 → 方案 → 模式 → 里程碑；财务中期对齐检查 #1（防大盘误当 TAM）	商业计划书叙事稿 v0.5；对齐记录	Day6 测算框架
Day7	11-08 日	demo	修 Bug 批次 #1；完善退出 / 关停；合规文案替换；素材接入窗口	demo v0.8	Day6 Bug 表
Day8	11-09 一	调研	正文撰写冲刺：产业章 + 用户 / 场景章；图表数据只引用已核验出处	报告正文 v0.7	Day7 填充目录
Day8	11-09 一	商业计划书	整合竞争 / 产品 / 模式 / 财务进可读商业计划书；盈利与回本叙事	商业计划书整合稿 v0.7	Day7 叙事；调研 v0.7 窗口
Day8	11-09 一	demo	交互完善：有限选项反馈、完播 / 退出状态；弱网模拟与兜底；验收检查表	demo v0.9 + 验收检查表	Day7 v0.8
Day9	11-10 二	调研	商业与结论章；全文首次通读；统一术语（睡眠经济 / 单向低唤醒；辅助工具不作产品主词）	报告全文初稿 v1.0-draft	Day8 正文
Day9	11-10 二	商业计划书	**修改空档**：按报告初稿刷新定位与数字；关键假设清单 v1；统一术语	商业计划书 v1.0-draft	Day9 报告初稿（可先改结构后填数）
Day9	11-10 二	demo	内容替换为接近终态素材；体验打磨；可选 AR 开场仅评估工时，**默认不进主路径**	素材替换完成说明	Day8 v0.9；AR 后置决策
Day10	11-11 三	调研	**交叉核验**：出处可点、表文一致、无疗效表述；出修改清单	核验清单 + 修改单 #1	Day9 初稿
Day10	11-11 三	商业计划书	路演一页逻辑；财务情景自洽；与调研对齐检查 #2	商业计划书一页逻辑 + 情景自检	Day9 商业计划书 draft
Day10	11-11 三	demo	**测试日**：主路径三轮走查；文案终对齐与合规上屏；记缺陷优先级	测试记录 + 缺陷优先级表	Day9 素材替换
Day11	11-12 四	调研	按修改单 #1 改稿；图表需求；统稿推进	报告 v1.1 + 图表需求单	Day10 修改单
Day11	11-12 四	商业计划书	按报告 v1.1 刷新；财务节撰稿嵌入；版式初排	商业计划书 v1.1	Day11 报告 v1.1 窗口
Day11	11-12 四	demo	修缺陷 P0 / P1；回归主路径；**功能冻结候选**（只修 bug）；出联调包 v0.9	demo v1.0-rc	Day10 缺陷表
Day12	11-13 五	调研	**终稿前修改空档**（禁止新开大章）：润色、统一出处、附录清单	报告 v1.2-rc	Day11 v1.1

天数	日期	工作模块	具体任务	预期产出	依赖/前置
Day12	11-13 五	商业计划书	终稿前修改空档：删重复、对齐 demo 截图 / 链接；财务自检出门清单	商业计划书 v1.2-rc	Day11 v1.1；demo rc 可并行贴图
Day12	11-13 五	demo	冻结功能；联调按验收用例走通；只修阻断性缺陷；整理演示脚本（≤3 分钟）	demo 功能冻结 + 演示脚本	Day11 rc
Day13	11-14 六	三项联合	**预终验联调**：报告 × 商业计划书 × demo 口径三对照；合规自检；彩排一遍	三对照检查表 + 彩排记录 + 残余问题清单	Day12 三份 rc；**不得把大改堆到 Day14**
Day13	11-14 六	终审	内容终审书面意见；视觉抽审（表居中、字号、留白）	终审书面结论 ⩾1 轮	Day12–13 近终稿
Day13	11-14 六	修改	仅消化终审与联调残余（小改）；出三项「待终验」包	待终验包（报告 / 商业计划书 / demo）	Day13 终审结论
Day14	11-15 日	终验交付	**三项终验**：①睡眠经济市场调研报告 ②商业计划书 ③demo；签署验收意见；归档路径与版本号	验收纪要 + 终态三件套路径清单	Day13 待终验包

4.5 关键空档与不并行约束

类型	安排
调研核验空档	Day6（中期）、Day10（交叉核验）；报告终稿依赖两轮空档已执行
demo 测试空档	Day6（可用性自测）、Day10（三轮走查）、Day12（联调）
商业计划书 / 财务对齐空档	Day7、Day10 与调研对齐；Day12 自检修订；禁止首次完整测算压到 Day13–14
明确不并行	Day13–14 禁止新开调研大章或 demo 主功能；AR 评估不得挤占网页主路径测试空档
周末产能	Day6–7、Day13–14 侧重核验 / 测试 / 联调 / 终验；大段新写尽量落在工作日

4.6 主要风险与缓冲（进度控制）

风险	缓冲安排
公开数据不可溯源 / 互相矛盾	Day6、Day10 双核验；报告标「待核实」而非编造；缺证超阈则压缩非主选章节篇幅
调研拖期挤压商业计划书 / demo	商业计划书 / demo 早并行；Day9 / Day11 刷新窗；禁止 Day13–14 堆大改；必要时裁范围先保三项可验形态
demo 链路 / 素材延误	Day1 锁定以网页呈现；AR 后置；静图 + 静音可先走通；P0 未清不得进 Day12 冻结
口径漂移（疗效词、产品主词偏移、开放长聊）	Day1 口径一页；Day9 术语统一；Day13 三对照；终审可否决相关表述
财务虚高或混口径	大盘不作收入池；禁用未核读全球总盘锚点；假设可解释并标注数据依赖；不编造签约额

05　阶段性里程碑

下列里程碑与日计划 M0–M6 严格对应。制图见上文图4-2。

里程碑	切点日期	对应日	可检查产出
M0 开题锁口径	2026-11-02	Day1	口径一页、三项成果定义、网页主路径确认
M1 调研中期核验	2026-11-07	Day6	核验记录、缺证清单（调研进行中，非「调研已完成」）
M2 三线初稿窗口	2026-11-10	Day9	报告初稿、商业计划书 draft、demo 近终态素材
M3 交叉核验与测试	2026-11-11	Day10	报告修改单、商业计划书自检、demo 测试记录
M4 功能 / 内容冻结	2026-11-13	Day12	报告 / 商业计划书 rc、demo 功能冻结 + 演示脚本
M5 预终验与终审	2026-11-14	Day13	三对照表、终审书面结论、待终验包
M6 三项终验交付	2026-11-15	Day14	验收纪要 + 睡眠经济市场调研报告 + 商业计划书 + demo 终态路径

补充说明：M3–M6 不得压缩为最后两天叠加高峰；核验与测试须在甘特上保留独立空档。

06　团队分工与责任安排

本计划按工作流推进，不列岗位职责与个人分工。

07　最终交付成果与验收标准

终态交付为下列 A、B、C 三项；验收时三项分别对照细则，且须满足全文边界要求（单向低唤醒、禁开放催睡长聊、不作疗效宣称、辅助工具不作产品主词、大盘不作软件 TAM）。

A．睡眠经济市场调研报告

验收项	细则
范围	围绕「原创睡眠搭子与沉浸式安抚」完成市场 / 竞品（或对标）/ 用户与场景 / 选题论证文稿；相关备选方向仅写清边界与处理方式，不另立平行主线
可追溯	竞品或对标对照、关键产业口径可追溯至公开出处或组内已标注来源的材料；未经二次审计的增速 / 占比等标注【待核实】
表述纪律	可用一句话复述目标用户与核心问题；不将广义睡眠经济大盘写作本软件 / 内容切口 TAM；不作疗效或医疗结论
地理口径	中国市场叙述为主，全球材料作对照，不默认海外为主战场
完成标志	形成可独立提交审阅的睡眠经济市场调研报告成稿；结构完整、口径与任务书及本章一致；甘特上可见搜集—核验—撰稿—审核独立空档

B．商业计划书

验收项	细则
定位一致	产品定位表述、服务对象、主场景与主路径机制与睡眠经济市场调研报告及 demo 方案表述一致
商业讨论	写清使用方 / 付费方假设；付费路径讨论优先内容包、联名或主题房加价、酒店或差旅捆售；单独 ToC 月订阅不作唯一假设
边界写入	明确禁止开放催睡长聊作主路径；明确不作疗效 / 医疗验收；无已签署合作则合作方与合同金额不写死或标【待填】
财务纪律	假设可解释并标注调研依赖；不编造已签约金额；大盘不作项目可触达收入基数
与 demo 衔接	列出本期以网页呈现的 demo 所验证的主路径与不纳入本期的后置项（含 AR）；避免商业计划书承诺超出 demo 可演示范围的硬能力
完成标志	形成可审阅的商业计划书成稿，关键数字与假设可回溯调研或标注待验证

C．demo（以网页呈现，AR 后置）

验收项	细则
主路径闭环	可演示「进入—被场景与角色吸引—陪伴或有限短互动—自然结束并退出」；默认低互动、可关停、单次体验硬收束
载体	以网页原型优先；主验收不依赖 AR。可选 WebAR / 落角色开场为后置项：有则加分示意，无则不影响主路径通过；弱网与拒相机须有屏内角色兜底方案说明或实现
禁止项落地	界面与流程中不出现开放催睡长聊、自由闲聊或多轮情绪深聊作为主路径；必要处含非医疗、非疗效类提示占位
体验观察	具备小范围走查记录：用途是否被理解、进入与退出是否完成、刺激是否过强、关停是否可用；修改说明可复查
完成标志	导师或指定体验者在无长讲解情况下可走通主路径；方案文档与 demo 对主要功能表述一致；对外材料不出现疗效验收指标

三项共同底线

- A、B、C 对外口径一致，不得相互矛盾。
- 验收不包含睡眠时长改善、睡眠评分提升或医疗效果类指标；侧重完播 / 关停、主路径可走通、场景可用性。
- 核心功能深度开发、硬件到站检测、控梦 / 解梦、完整动作纠正、复杂 AR 跟拍识别等，均非本周期硬性前提；可选模块不阻塞 A / B / C 主验收。
