睡眠经济市场调研与产品孵化
项目时间计划书

十四天并行计划

项目周期

2026 年 11 月 2 日 — 2026 年 11 月 15 日

Day 1 – Day 14

目录

01 项目基本信息 3

02 项目背景与定位 3

03 项目总体目标 4

04 项目进度与时间安排 4

05 阶段性里程碑 11

06 协作接口与进度衔接 12

07 最终交付成果与验收标准 12

01　项目基本信息

项目	内容
项目名称	睡眠经济市场调研与产品孵化项目
项目周期	2026年11月2日至2026年11月15日，共14天
项目方向	原创睡眠搭子与沉浸式安抚
目标用户	以白领差旅人群为主要服务对象
核心场景	异地客房过夜，包括抵达当晚、连续出差期间及工作结束后回到酒店等场景
市场范围	中国市场为主，全球市场作为对照
最终成果	睡眠经济市场调研报告、商业计划书、demo

本项目围绕睡眠经济领域的睡前陪伴与过夜体验展开，以差旅白领在异地客房过夜时的情绪放松和注意力转移需求为主要切入点，探索原创IP、场景与声音相结合的沉浸式陪伴体验。

产品以低唤醒的短内容和有限互动为主要形式，用户可以选择角色与场景，进入相应环境，通过观看、安静陪伴或简单互动完成一次体验，并在内容结束后自然退出。

02　项目背景与定位

随着睡眠需求逐渐从基础睡眠用品向内容、服务和体验延伸，睡眠经济的产品形态也在不断丰富。除传统寝具、睡眠监测设备和助眠音频外，围绕睡前情绪、环境体验及陪伴需求的内容型产品，也为行业提供了新的探索方向。

差旅白领在异地客房过夜时，通常需要从工作状态切换到休息状态，但陌生环境、持续的工作思绪以及日常生活节奏的中断，可能使这一过程变得不够自然。现有应对方式包括播放白噪音、观看短视频、使用助眠应用或依靠个人习惯进行调整，但这些方式未必能够同时满足环境适应、注意力转移和陪伴体验等需求。

本项目选择以原创睡眠搭子与沉浸式安抚为产品方向，通过原创IP形象、场景氛围和声音内容构建具有辨识度的睡前体验。用户进入产品后，可以选择角色及场景，在相对安静的环境中观看内容、接受陪伴或进行简单互动，最终随着内容自然结束而退出。

产品主要采用单向短内容与有限互动的形式，不以开放式长时间聊天或多轮情绪交流作为主要体验方式。其价值在于提供一种具有场景感和内容辨识度的陪伴体验，而非提供医疗服务或对睡眠效果作出承诺。

在商业探索方面，项目将重点讨论内容包、品牌联名、酒店主题房加价以及酒店或差旅场景合作等可能路径。产品初期以网页demo作为主要展示载体，优先确保核心体验流程能够完整呈现。其他沉浸式技术形式可根据实际开发条件进一步评估，不作为本周期完成核心产品展示的前提。

03 项目总体目标

本项目计划在14天内完成市场研究、商业模式论证与产品原型展示，形成相互支撑的三项成果。

3.1 睡眠经济市场调研报告

围绕睡眠经济行业发展、细分市场、产业链、目标用户、竞品及市场机会开展系统研究，重点分析差旅白领在异地过夜场景中的实际需求，以及原创IP与沉浸式陪伴内容的市场切入可能性。

报告应当形成从行业背景到细分场景、从用户需求到竞争格局、再到市场机会判断的完整分析，为产品定位和后续商业决策提供依据。

3.2 商业计划书

结合市场调研形成的阶段性结论，明确产品定位、目标用户、核心价值、竞争特点及商业模式，分析内容付费、品牌联名、酒店合作等收入路径，并对成本、收入和盈利逻辑进行合理测算。

商业计划书应当与市场调研报告保持一致。涉及尚未获得充分证据支持的市场规模、用户转化率、合作资源和收入预测，应明确其假设性质，不将未经验证的判断表述为既定事实。

3.3 demo

围绕产品的核心使用流程，完成原创IP、主要场景、内容展示和基础交互设计，形成能够直观呈现产品体验的网页demo。

用户应能够完成角色与场景选择、进入体验环境、观看或接受陪伴、进行有限互动以及自然结束退出等主要步骤。产品应当具备基本的可操作性，而不仅是静态概念图或功能说明。

3.4 三项成果之间的关系

三项成果之间存在明确的先后支撑关系。

市场调研报告负责提供行业、用户和竞品方面的证据，为产品定位及商业判断提供基础；商业计划书在此基础上进一步明确产品方案和商业化路径；demo则将产品构想转化为可观察、可体验的原型，用于检验主要使用流程是否清晰、完整和可行。

demo的体验观察可以为市场调研和商业计划书中的部分假设提供补充，但不能将短期体验结果直接解释为睡眠效果改善或医疗功效。

04 项目进度与时间安排

项目采用市场调研、商业计划书和demo三条工作流并行推进的方式。市场调研提供主要证据基础，商业计划书根据阶段性研究结果逐步完善，demo则在产品方向和主要功能明确后启动实现。

三条工作流可以并行，但应当遵循必要的前置条件。尤其是商业计划书中的市场与财务判断需要随着调研结果更新，demo的功能范围则应优先保障核心体验流程，不因可选功能而影响主路径完成。

4.1 工作流安排

市场调研按照资料搜集、行业与用户分析、竞品研究、市场机会判断、报告撰写和交叉核验的顺序推进。

商业计划书从项目初期搭建内容框架，在获得阶段性调研结论后逐步完善产品定位、市场分析、商业模式和财务测算，并在后期与市场调研报告进行统一校对。

demo从产品需求和页面结构设计开始，逐步完成网页基础结构、角色与场景素材、交互流程及体验测试。网页是本周期的主要展示载体，其他技术形式不应挤占核心功能的开发和测试时间。

4.2 任务前置条件

后续任务	前置条件
demo核心流程设计与实现	项目方向、产品定位和主要体验流程明确
商业计划书中的财务情景定稿	已形成用户需求、产品边界和商业模式的阶段性判断，并在报告初稿完成后进行更新
市场调研报告最终定稿	中期核验和交叉核验均已完成，重要数据及引用能够追溯
三项成果最终验收	三项成果已完成相互校对，核心问题已在预终验阶段处理

4.3　14天每日计划

以下日期、任务和预期产出构成本项目的具体执行安排。

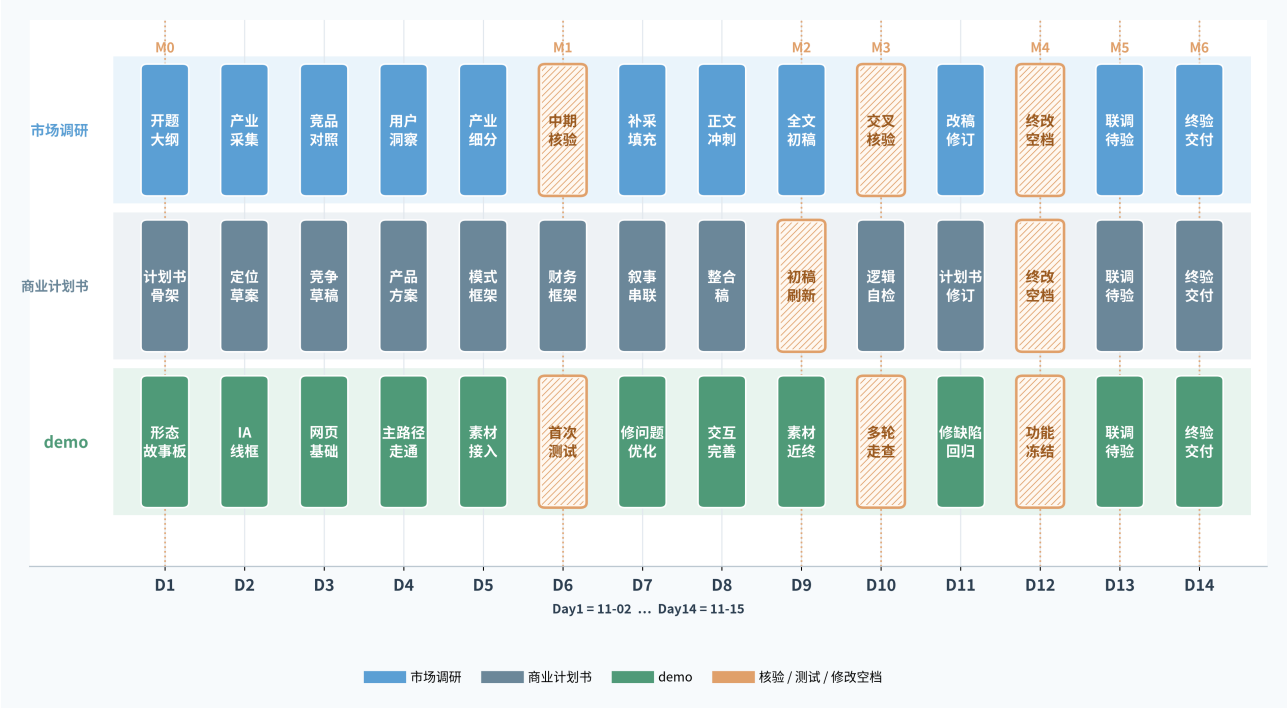


图4-1　14天三工作流甘特（市场调研 / 商业计划书 / demo）

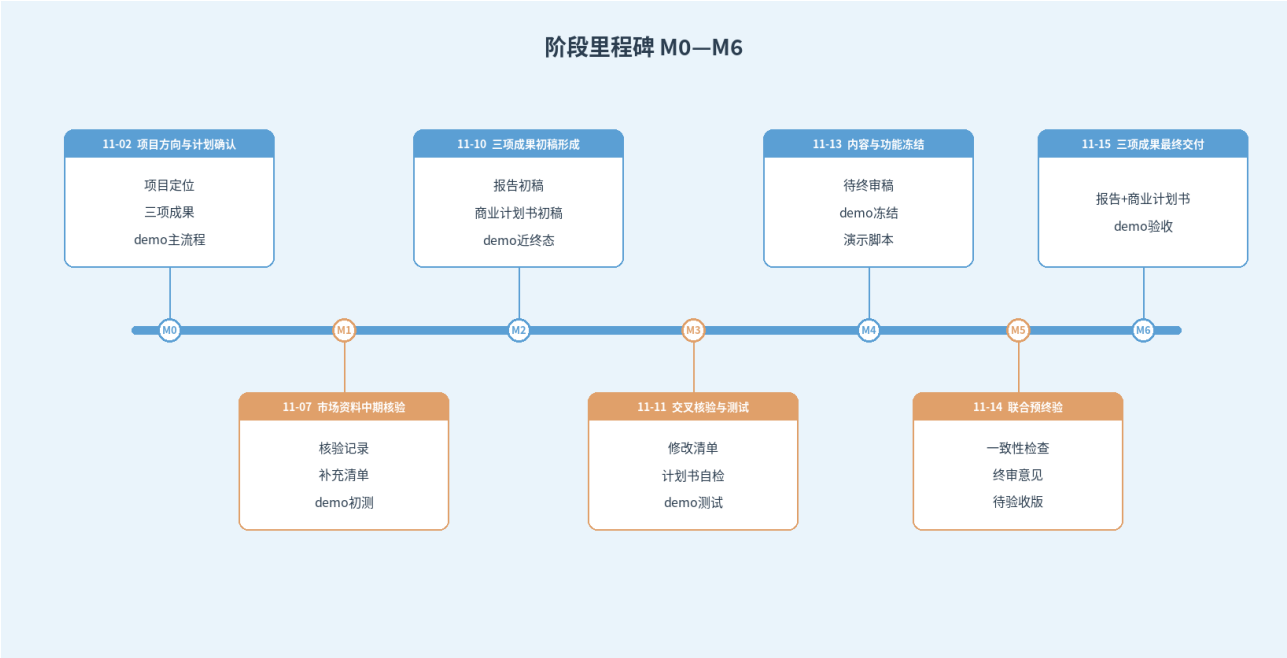


图4-2　阶段里程碑 M0—M6

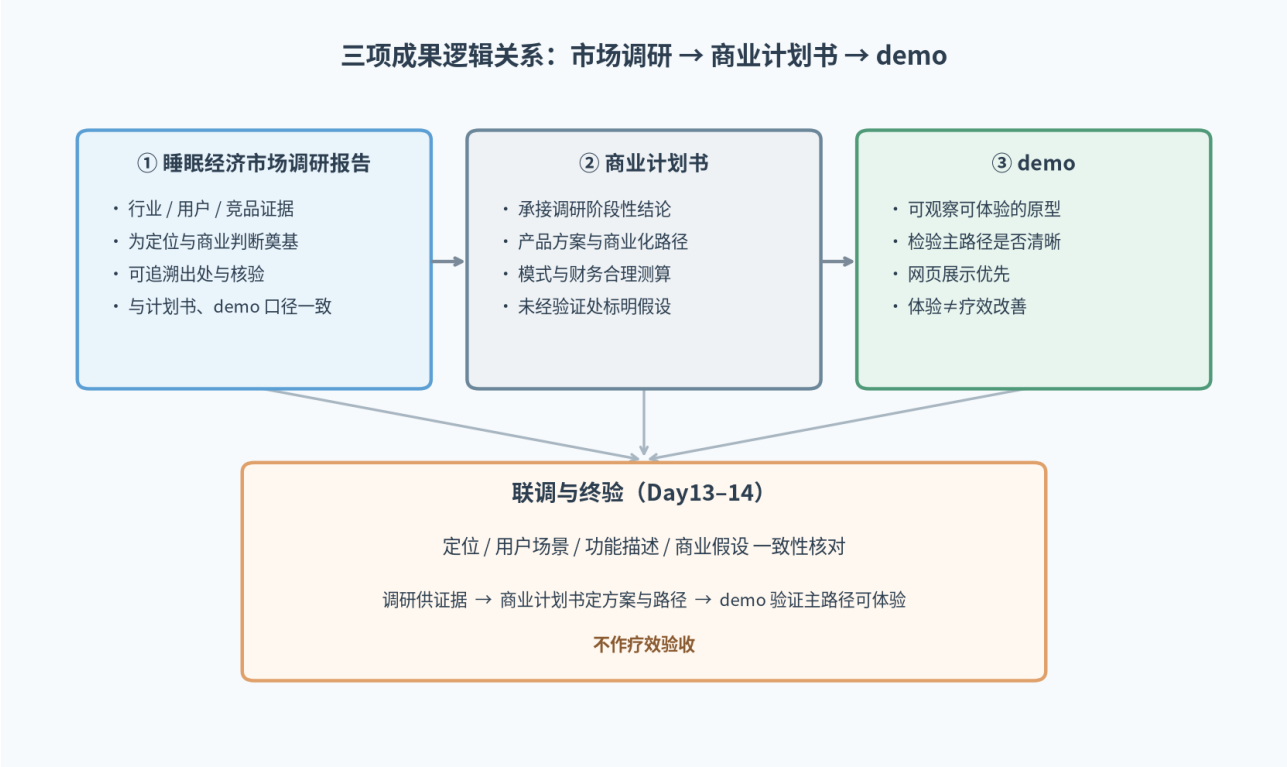


图4-3　三项成果逻辑关系

天数及日期	工作模块	具体任务	预期产出
Day1　11月2日	项目统筹	明确项目方向、三项最终成果、产品核心场景和验收要求；建立资料库与文件目录，统一项目基本口径。	项目基本口径、成果目录及工作安排
Day1　11月2日	市场调研	确定研究问题、报告章节结构、资料搜集范围及出处记录方式，建立后续核验所需的资料索引。	市场调研报告大纲、资料记录模板
Day1　11月2日	商业计划书	搭建商业计划书整体框架，标出需要由市场调研补充的数据和判断，初步整理财务测算所需字段。	商业计划书初步框架
Day1　11月2日	demo	明确网页展示形式及主要使用流程，确定角色与场景选择、体验进入、内容陪伴和退出等核心页面。	demo产品流程及初步故事板
Day2　11月3日	市场调研	搜集睡眠经济的定义、行业范围、市场规模、发展趋势及相关产业资料，整理公开数据和待进一步核验的信息。	行业资料汇总、市场数据初步清单
Day2　11月3日	商业计划书	根据项目方向形成初步产品定位，梳理差旅白领的使用场景，并提出内容包、品牌联名、酒店合作等商业模式假设。	产品定位初稿、商业模式假设
Day2　11月3日	demo	完成页面信息架构及主要页面线框设计，明确首页、场景选择页、陪伴体验页和退出页面的基本内容。	页面结构及线框初稿
Day3　11月4日	市场调研	搜集国内外睡眠经济相关产品及服务案例，建立竞品分析维度，整理产品定位、目标用户、功能、价格和商业模式等信息。	竞品对照表初稿
Day3　11月4日	商业计划书	根据竞品资料形成竞争分析初稿，同时梳理产品开发、内容制作和运营可能涉及的成本类别。	竞争分析初稿、成本结构框架

天数及日期	工作模块	具体任务	预期产出
Day3　11月4日	demo	搭建网页基础结构和页面组件，打通主要页面之间的跳转，形成可以实际点击体验的基础版本。	可操作的网页基础版本
Day4　11月5日	市场调研	研究目标用户及其在异地客房过夜场景中的需求，整理工作思绪、陌生环境、睡前陪伴和现有替代方式等相关信息。	用户与场景分析初稿
Day4　11月5日	商业计划书	梳理产品核心价值和功能边界，明确产品为谁提供服务、解决什么场景问题，以及可能由谁付费。	产品方案初稿、收入逻辑梳理
Day4　11月5日	demo	完成核心体验流程的基础交互，实现角色或场景选择、内容进入、陪伴体验和自然退出等主要环节。	demo核心流程初版
Day5　11月6日	市场调研	完善产业链和细分市场分析，区分睡眠经济整体市场与本项目所对应的具体产品切口，推进中国市场研究并补充海外对照材料。	产业链及细分市场分析初稿
Day5　11月6日	商业计划书	初步形成商业模式框架，整理不同收入路径的适用条件、付费主体和潜在合作场景，建立财务测算框架。	商业模式框架、财务测算字段表
Day5　11月6日	demo	完成原创IP和主要场景的视觉素材初步接入，完善页面氛围、陪伴内容及退出方式，检查无声音情况下的基本使用流程。	主要视觉素材及体验流程初版
Day6　11月7日	市场调研	开展中期资料核验，抽查数据出处、检查不同来源之间的口径差异，整理缺失证据和需要补充搜集的内容。	中期核验记录、资料补充清单
Day6　11月7日	商业计划书	建立保守、基准和乐观三种财务情景的测算框架，明确各项假设及其所依赖的数据。	财务测算初步框架
Day6　11月7日	demo	开展第一次完整体验测试，检查主要流程能否顺利完成、退出功能是否有效，并模拟弱网等基本使用情况。	初步测试记录、问题清单
Day7　11月8日	市场调研	根据中期核验结果补充资料，完善行业、用户、竞品和产业链内容，逐步形成完整报告结构。	市场调研报告主体内容初稿
Day7　11月8日	商业计划书	将产品问题、解决方案、商业模式和发展路径串联起来，结合已有财务框架检查商业逻辑的一致性。	商业计划书叙事初稿
Day7　11月8日	demo	修复第一轮测试发现的问题，完善退出和关停功能，补充必要的交互反馈及页面素材。	demo优化版本
Day8　11月9日	市场调研	集中撰写行业分析、用户需求与使用场景等主要章节，整理必要图表，图表中的数据仅采用已经核验的资料。	市场调研报告主体初稿
Day8　11月9日	商业计划书	整合市场竞争、产品方案、商业模式和财务分析，形成结构完整、可以连续阅读的商业计划书版本。	商业计划书整合稿
Day8　11月9日	demo	完善有限互动、内容结束状态和退出反馈，检查弱网情况下的使用体验，形成主要功能验收检查表。	demo完善版本及检查表
Day9　11月10日	市场调研	完成商业分析与结论部分，通读报告全文，统一重要术语和分析口径，形成完整初稿。	睡眠经济市场调研报告初稿

天数及日期	工作模块	具体任务	预期产出
Day9　11月10日	商业计划书	根据市场调研阶段性结论更新产品定位、市场判断和商业假设，完善关键财务假设及其依据。	商业计划书初稿
Day9　11月10日	demo	将主要页面替换为接近最终效果的视觉与内容素材，检查完整体验流程。其他沉浸式技术形式仅进行必要评估，不纳入核心开发任务。	demo近终态版本
Day10　11月11日	市场调研	开展交叉核验，检查资料出处是否有效、数据与正文是否一致、结论是否有证据支撑，并排查不恰当的医疗或疗效表述。	交叉核验记录、报告修改清单
Day10　11月11日	商业计划书	检查商业计划书中的市场判断、收入逻辑和财务情景，确保与市场调研的阶段性结论一致。	商业计划书逻辑及财务自检记录
Day10　11月11日	demo	对主要使用流程进行多轮走查，检查页面跳转、交互反馈、内容展示和退出功能，记录问题及修复优先级。	demo测试记录、问题优先级清单
Day11　11月12日	市场调研	根据交叉核验结果修改报告，完善图表及数据说明，统一章节结构和资料引用。	市场调研报告修订稿
Day11　11月12日	商业计划书	根据报告修订结果更新商业计划书中的市场、产品和财务内容，完成主要章节整合及初步排版。	商业计划书修订稿
Day11　11月12日	demo	修复测试中影响主要流程的关键问题，完成主路径回归测试，准备供最终联调使用的版本。	demo候选版本
Day12　11月13日	市场调研	进行最终修改，重点处理重复内容、文字表达、数据引用和章节衔接，不再新增大规模研究章节。	市场调研报告待终审稿
Day12　11月13日	商业计划书	统一全文表达，检查财务测算和商业模式逻辑，完善必要的demo展示内容。	商业计划书待终审稿
Day12　11月13日	demo	完成核心功能冻结，按照验收流程进行联调，只处理影响主要体验的缺陷，并整理简洁的演示流程。	demo功能冻结版本及演示脚本
Day13　11月14日	三项成果联合检查	对市场调研报告、商业计划书和demo进行统一检查，核对产品定位、用户场景、功能描述和商业假设是否一致。	三项成果一致性检查表
Day13　11月14日	内容与视觉终审	检查文字表达、数据引用、表格、图表、页面布局及产品边界，形成最终修改意见。	终审意见及修改清单
Day13　11月14日	最终修改	根据终审意见处理必要的小范围修改，整理三项成果的待验收版本。	三项成果待验收版本
Day14　11月15日	最终验收与交付	分别检查三项成果是否达到既定标准，完成最终文件整理、演示检查和交付。	睡眠经济市场调研报告、商业计划书、demo

4.4　关键时间安排与进度控制

为避免调研、商业分析和产品开发在最后阶段集中堆积，项目安排了独立的资料核验、产品测试和成果修改时间。

工作事项	时间安排	主要目的
市场资料中期核验	Day6，11月7日	检查资料出处、数据口径和研究缺口

工作事项	时间安排	主要目的
市场资料交叉核验	Day10，11月11日	检查数据与结论的一致性，形成修改清单
demo第一次测试	Day6，11月7日	检查核心流程是否能够完成
demo第二次测试	Day10，11月11日	多轮走查，集中发现并修复问题
demo功能冻结与联调	Day12，11月13日	确保最终演示版本稳定
商业计划书与市场研究对齐	Day7、Day10、Day11	根据阶段性调研结果持续更新商业假设
三项成果联合预终验	Day13，11月14日	检查三项成果的定位、数据和功能描述是否一致
最终验收	Day14，11月15日	完成三项成果的正式交付

周末时间主要用于资料核验、测试、修改和联合检查，尽量避免将大规模的新内容撰写任务集中安排在周末。

4.5 主要风险与应对安排

可能出现的问题	应对安排
公开数据无法追溯或不同来源之间存在差异	在中期核验和交叉核验阶段检查数据出处；对无法确认的数据明确标注，不以未经核实的数字支撑关键结论
市场调研进度影响商业计划书和demo	商业计划书与demo提前启动，但对依赖调研的数据和结论保留更新空间，在初稿和修订阶段及时对齐
demo页面或素材制作延迟	优先完成网页核心流程，其他沉浸式技术形式后置，确保主要体验可以独立展示
产品定位和宣传表述出现偏差	统一产品定位及相关表述，避免将产品描述为医疗服务，也不将AI作为产品核心卖点
财务测算缺少可靠依据	将测算假设与实际数据区分，明确收入路径和成本来源，不将行业整体市场规模直接作为项目收入基础

05 阶段性里程碑

为便于检查项目进度，14天设置七个关键里程碑。各节点与每日任务安排保持一致。

里程碑	完成日期	对应天数	阶段性成果
M0 项目方向与计划确认	2026-11-02	Day1	项目定位、三项成果定义、demo主要流程和工作安排明确
M1 市场资料中期核验	2026-11-07	Day6	中期核验记录、资料补充清单、demo初步测试记录
M2 三项成果初稿形成	2026-11-10	Day9	睡眠经济市场调研报告初稿、商业计划书初稿、demo近终态版本
M3 交叉核验与测试	2026-11-11	Day10	报告修改清单、商业计划书自检记录、demo测试记录
M4 内容与功能冻结	2026-11-13	Day12	报告和商业计划书待终审稿、demo功能冻结版本及演示脚本
M5 联合预终验	2026-11-14	Day13	三项成果一致性检查表、终审意见、待验收版本

里程碑	完成日期	对应天数	阶段性成果
M6 三项成果最终交付	2026-11-15	Day14	睡眠经济市场调研报告、商业计划书、demo完成验收

其中，Day10的交叉核验与测试、Day12的功能冻结和Day13的联合预终验均应独立保留，不应将这些工作压缩到最终交付当天集中处理。

06　协作接口与进度衔接

三项成果由不同工作流并行推进，但在关键节点需要共享阶段性成果，避免各部分独立完成后出现定位、数据和功能描述不一致的问题。

工作衔接	主要衔接内容	时间安排
市场调研与商业计划书	将行业趋势、用户需求、竞品信息和市场机会逐步转化为产品定位、商业模式及财务测算依据	Day7—Day9形成阶段性输入，Day9及Day11更新
市场调研与demo	将用户场景、产品边界和行业约束转化为demo的功能与内容要求	Day5前明确主要产品边界，后续根据测试情况调整
商业计划书与财务测算	根据商业模式梳理收入路径、成本结构和关键测算假设，保持数字来源和商业叙事一致	Day4—Day6建立框架，Day11完成主要内容整合
产品设计与网页实现	将页面结构、体验流程和内容素材转化为可操作的网页展示	Day2启动页面设计，Day3起逐步实现，Day11完成关键功能修订
三项成果与最终验收	统一核对项目定位、目标用户、核心场景、功能范围及商业假设	Day13—Day14

在进度安排上，优先保障三项成果的主要内容完整、逻辑一致和核心功能可展示。对于不影响主要成果验收的视觉细节和可选技术形式，可以根据剩余时间适当调整，但不得影响市场资料核验、demo测试及最终成果检查。

07　最终交付成果与验收标准

本项目最终交付三项成果。三项成果分别验收，同时需要确保它们在产品定位、目标用户、核心场景及商业逻辑方面保持一致。

7.1　睡眠经济市场调研报告

验收维度	具体要求
研究范围	涵盖睡眠经济行业发展、市场规模、产业链、细分市场、目标用户、竞品及市场机会
用户与场景	能够说明差旅白领在异地客房过夜场景中的主要需求及现有解决方式
竞品分析	形成具有可比性的竞品或相关产品对照，说明各类产品的功能、定位及商业模式
数据可靠性	关键数据具有可追溯来源，重要数据经过交叉核验；无法确认的数据明确标注
市场判断	区分睡眠经济整体市场与本项目对应的具体产品切口，不将行业大盘直接作为本项目可触达市场规模

验收维度	具体要求
研究结论	能够从行业、用户和竞品分析中提炼出与项目定位相关的市场机会
完成标准	形成结构完整、逻辑连贯、可以独立提交审阅的睡眠经济市场调研报告

7.2 商业计划书

验收维度	具体要求
产品定位	产品定位、目标用户、核心场景和体验流程与市场调研报告及demo一致
市场分析	能够说明项目所处的市场环境、用户需求和竞争情况，关键判断有调研依据
商业模式	讨论内容包、品牌联名、主题房加价及酒店或差旅合作等收入路径，不将单一订阅模式作为唯一假设
盈利逻辑	明确成本、收入和关键假设，测算过程具有可解释性，不编造合作金额或已签约收入
产品衔接	商业计划书所描述的核心功能应当能够在demo中展示，未实现的功能不得作为已经具备的能力
风险分析	对市场、运营、技术和商业化过程中的主要不确定性作出说明
完成标准	形成结构完整、商业逻辑清楚、关键数据和假设可追溯的商业计划书

7.3 demo

验收维度	具体要求
核心流程	能够展示角色与场景选择、进入体验、观看或接受陪伴、有限互动以及自然结束退出
视觉内容	具有原创IP形象、主要场景及相应的视觉和声音内容
基础交互	页面之间能够正常跳转，主要功能具有明确的操作反馈
退出机制	用户能够随时退出，单次体验具有明确的结束状态
稳定性	主要页面能够正常打开和操作，完成基本体验测试
体验观察	通过小范围走查记录主要问题，检查使用者是否能够理解流程并顺利完成体验
完成标准	在无需长时间讲解的情况下，体验者能够独立完成主要体验流程

7.4 三项成果的共同要求

三项成果应当在以下方面保持一致：

- 产品定位和目标用户一致。
- 核心使用场景和主要体验流程一致。
- 商业计划书中的核心功能与demo实际展示范围一致。
- 市场调研中的数据和结论能够支撑商业计划书中的关键判断。
- 不将产品描述为具有医疗功效的服务，不以睡眠时长或睡眠评分改善作为本项目的验收标准。

本周期重点完成市场研究、商业论证和核心体验展示。硬件研发、复杂AR交互、睡眠监测、医疗诊断及其他非核心功能不作为本次三项成果验收的必要条件。
